


## Hochwasserschutz und Deichsicherheit



Planungsausschuss des Regionalrates Düsseldorf  
Düsseldorf, 12.09.2013

Regierungsbaudirektor Matthias Börger  
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 54

## Entwicklung der Deichsanierung im Regierungsbezirk

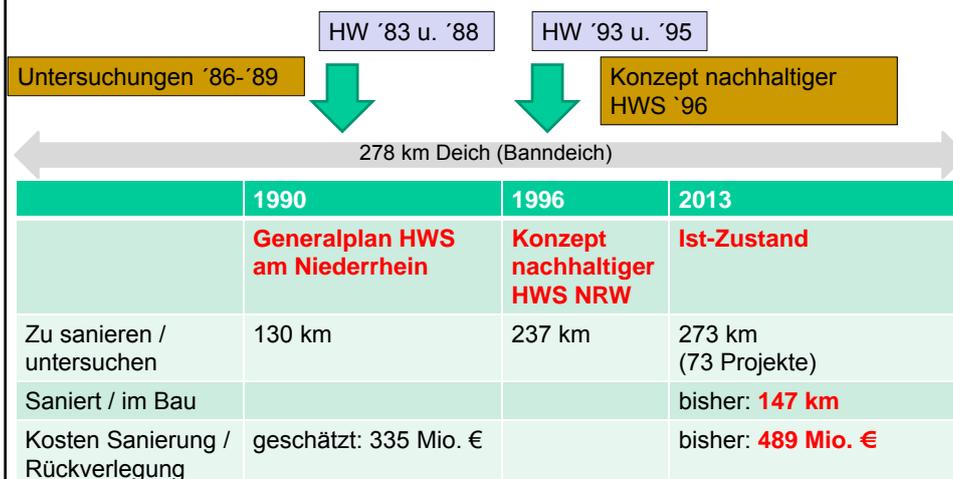

## Stand der Deichsanierungen

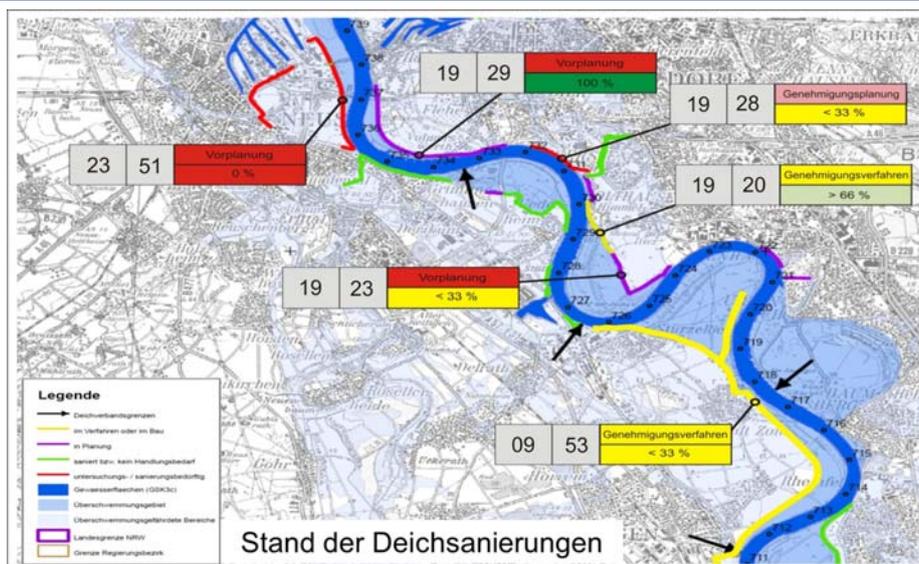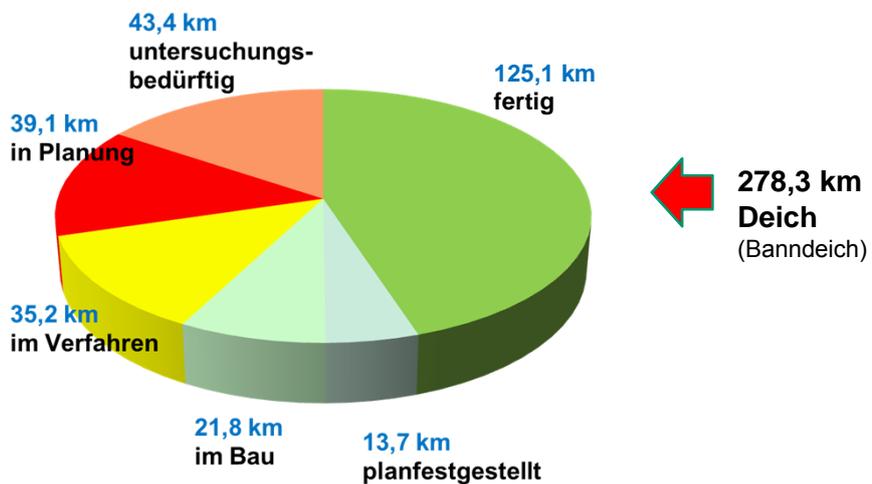

Bezirksregierung Düsseldorf

Hochwasserschutz und Deichsicherheit

### Rückhalteräume im Regierungsbezirk Düsseldorf

Stand	Maßnahme	Rückhalteraum [Mio. m <sup>3</sup> ]
Fertig gestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monheim</li> <li>• Bislicher Insel</li> <li>• Orsoy</li> </ul>	<p><b>8</b></p> <p><b>50</b></p> <p><b>10</b></p>
In Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lohrward</li> </ul>	<b>15</b>
Planfestgestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mündelheim</li> </ul>	<b>5</b>
In Planung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orsoy-Land</li> <li>• Reckerfeld</li> <li>• (Itter)</li> </ul>	<p><b>22</b></p> <p><b>11</b></p> <p>-</p>
Flächensicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bylerwardt</li> <li>• Ilvericher</li> </ul>	<p><b>36</b></p> <p><b>10</b></p>
Summe:		<b>167*)</b>
*) Rhein insgesamt (2010/ 2020):		229 / 535

12. September 2013 [www.brd.nrw.de](http://www.brd.nrw.de) 5

Bezirksregierung Düsseldorf

Hochwasserschutz und Deichsicherheit

### Finanzvolumen der Hochwasserschutzmaßnahmen im Regierungsbezirk Düsseldorf

	[km]	Gesamtkosten [Mio. €]	bisher entstanden [Mio.€]	noch zu erwarten [Mio. €]	Gesamtförderung [Mio. €]	bisher verausgabt [Mio. €]	noch bereit zu stellen [Mio. €]
∑ fertig	125	419	419	0	317	317	0
∑ planfestgestellt	14	90	0	90	79	0	79
∑ im Bau	22	70	70	0	50	50	0
∑ im Verfahren	35	159	0	159	124	0	124
∑ in Planung	39	198	1	197	155	1	154
∑ zu untersuchen	43	191	0	191	153	0	153
Insgesamt ca.:	<b>278</b>	<b>1127</b>	<b>490</b>	<b>637</b>	<b>878</b>	<b>368</b>	<b>510</b>

12. September 2013 [www.brd.nrw.de](http://www.brd.nrw.de) 6

### Veränderungen im Haushalt für den Hochwasserschutz

	HH 2012	HH 2013	Differenz
<b>Kapitel 10 050, TG 66</b> „Hochwasserschutz u.a.“ (reine <b>Landesmittel</b> )	40 Mio. € <sup>(*)</sup> (33,3 Mio. € für „HWS“)	30 Mio. € <sup>(*)</sup> (23,3 Mio. € für „HWS“)	<b>-10 Mio. €</b>
<b>Kapitel 10 080, TG 66</b> „Verb. Agrarstruktur, Küstenschutz“; Wasserwirtschaft ( <b>Bundesanteil 60 %</b> )	15,0 Mio. €	15,1 Mio. €	+0,1 Mio. €
<b>Kapitel 10 080, TG 76</b> „Verb. Agrarstruktur, Küstenschutz“; Wasserwirtschaft ( <b>Landesanteil 40 %</b> )	10,0 Mio. €	10,1 Mio. €	+0,1 Mio. €

<sup>(\*)</sup> Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung HWRM-RL, Ü-Gebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum

### Veränderungen in der Förderung

	2012	2013	Differenz
Fördersatz gem. „Richtlinie wasserbauliche Maßnahmen“ <sup>(*)</sup>	40 – 80 %	40 – 80 %	
Max. Förderung Deichbau	80 %	70 % <sup>(**)</sup>	<b>-10 %</b>
Zinsgünstige Kredite der NRW-Bank zur Finanzierung des Eigenanteils		Konditionen stehen noch nicht fest <sup>(**)</sup>	<b>(+ X)</b>

<sup>(\*)</sup> Förderrichtlinie wasserbauliche Maßnahmen (Runderlass MUNLV vom 30.06.2009 MBl. NRW. S. 354; ergänzt 27.09.2010, Az.: MKULNV IV-5-4000-22250)

<sup>(\*\*)</sup> MKULNV-Erlass hierzu steht noch aus (aktueller Diskussionsstand)

